


# 项目工作任务下发及积分统计执行V1.2

| 版本号 | 变更内容说明                                            |
|-----|---------------------------------------------------|
| 1.1 | 修改了第四项原型发布说明，要求原型统一由项目开发负责人打包发布到统一地址，并设置密码后提供到项目群 |
| 1.2 | 去除云积分系统关联                                         |

## 一、项目执行流程图

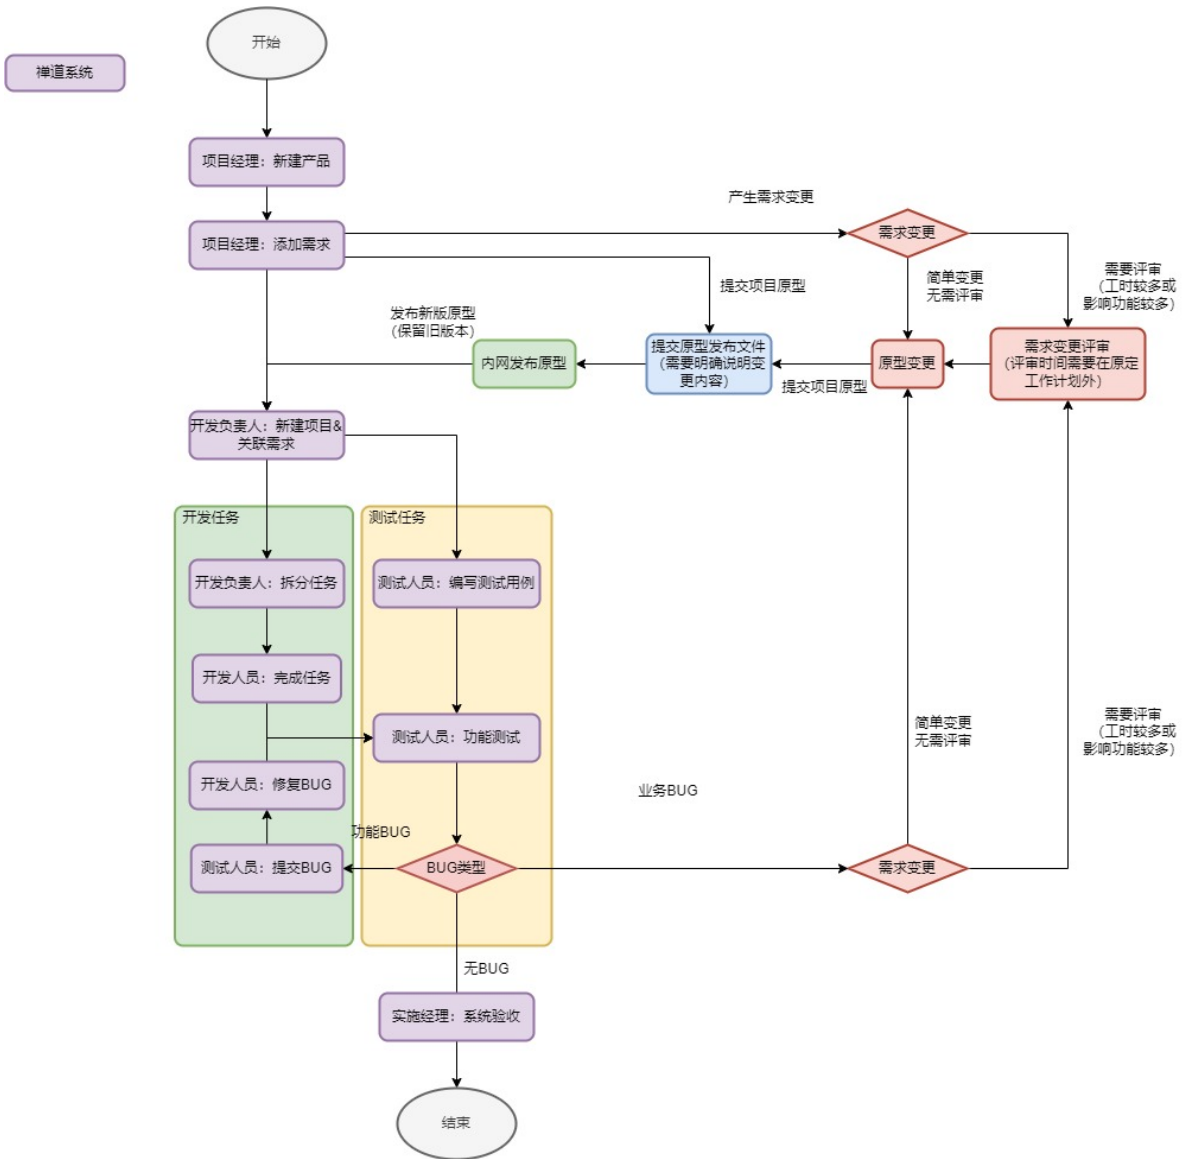

## 二、工作职责

## 2.1 前置工作（项目团队集体完成）

禅道项目建立前应完成的工作内容

1. 建立内部项目开发群，确定开发负责人。
2. 项目经理群内提供项目需求文件或原型，并组织开发团队及测试人员进行一次评审。
3. 开发负责人与成员了解需求文件并记录问题（Excel形式），并组织二次评审，项目经理应将问题解答记录到对应功能的原型中。
4. 一次评审与二次评审需要形成文件记录（见附表）。
5. 二次评审后，若问题还是比较多，应组织第三次评审。
6. 评审结束后需要输出项目工时，应细到每个菜单页，单位为小时（该步骤可以直接在禅道上进行，根据项目需求拆分任务）。

## 2.2 禅道系统

### 2.2.1 新增产品

执行人：项目经理

工作内容：禅道新增产品：输入产品信息。

开源SRM第一版

需求 | 计划 | 发布 | 路线图 | 项目 | 动态 | 文档 | 模块 | 概况

添加产品

产品名称

xxx项目

\*

产品代号

\*

产品线

维护产品线

产品负责人

8 许婉南

×

+

填产品经理或项目经理

测试负责人

9 陈沈阳

×

+

填开发负责人

发布负责人

×

+

产品类型

正常

▼

产品描述

H1 | 格式 | 文本 | 列表 | 表格 | 代码 | 链接 | 附件 | 表情 | 更多

可以在编辑器直接贴图。

访问控制

☒ 默认设置(有产品视图权限，即可访问)

☐ 私有产品(只有产品相关负责人和项目团队成员才能访问)

☐ 自定义白名单(团队成员和白名单的成员可以访问)

保存

返回

### 2.2.2 新增项目

执行人：开发负责人

工作内容：新增项目，输入项目信息，项目时间安排，项目成员，关联产品。

银轮信息科技有限公司

我的地盘产品项目测试文档统计组织后台

项目 - 编号(必填)

添加项目

云积分禅道 -

任务看板燃尽图更多需求测试文档团队动态产品概况

添加项目

复制项目

项目名称

\*

填写项目名称

项目代号

\*

起始日期

2022-01-18

至

截止日期

\*

☐ 一周

☐ 两周

☐ 一个月

☐ 两个月

☐ 三个月

☐ 半年

☐ 一年

可用工作日

天

团队名称

项目类型

短期项目

关联产品

上一步建立的产品

关联计划

H1

g

Y

T

A

B

/

U

编辑器

三

可以在编辑器直接贴图。

保存模板

应用模板

项目描述

默认设置(有项目视图权限, 即可访问)

### 2.2.3 添加需求

执行人：项目经理

工作内容：在项目中录入系统开发的需求，若原型比较完善的情况下，信息可以从简，可以使用功能截图进行批量导入

说明：

1. 常规需求应该为上线前需求
2. 如果需要发布上线后需求，需要选择需求来源为上线后，评审后填写对应需要的预计工时。改动量少的变更口可以直接下发上线后需求，预计工时为0

#### 2.2.3.1 单个需求新增

预计工时需要进行填写

银轮信息科技有限公司

我的地盘产品项目测试文档统计组织后台

需求 - 编号(必填) GO 撤销

产品主页

云积分禅道测试 -

需求计划发布路线图项目动态文档模块概况

提需求

所属产品

云积分禅道测试

所属模块

/

维护模块

刷新

计划

需求来源

来源备注

由谁评审

不需要评审

需求名称

必填：需求名称

H1

g

Y

T

A

B

/

U

编辑器

三

可以在编辑器直接贴图。

需求描述

必填：需求描述

H1

g

Y

T

A

B

/

U

编辑器

三

可以在编辑器直接贴图。

验收标准

附件

添加文件

(不超过50M)

优先级

预计

工时

保存模板

应用模板


必填：根据需求类型填写需求来源

必填：任务优先级

#### 2.2.3.2 批量需求新增


预计工时需要进行填写

方法一：直接必填填写

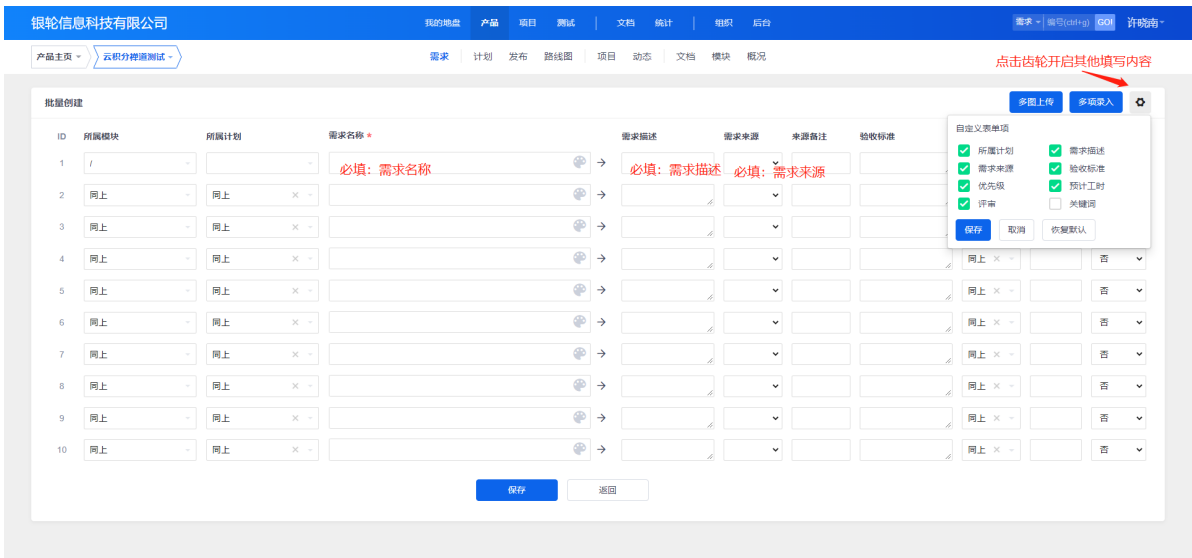

## 方法二：多图上传

可将项目原型截图保存为项目名称，并批量拖到系统中，点击开始上传

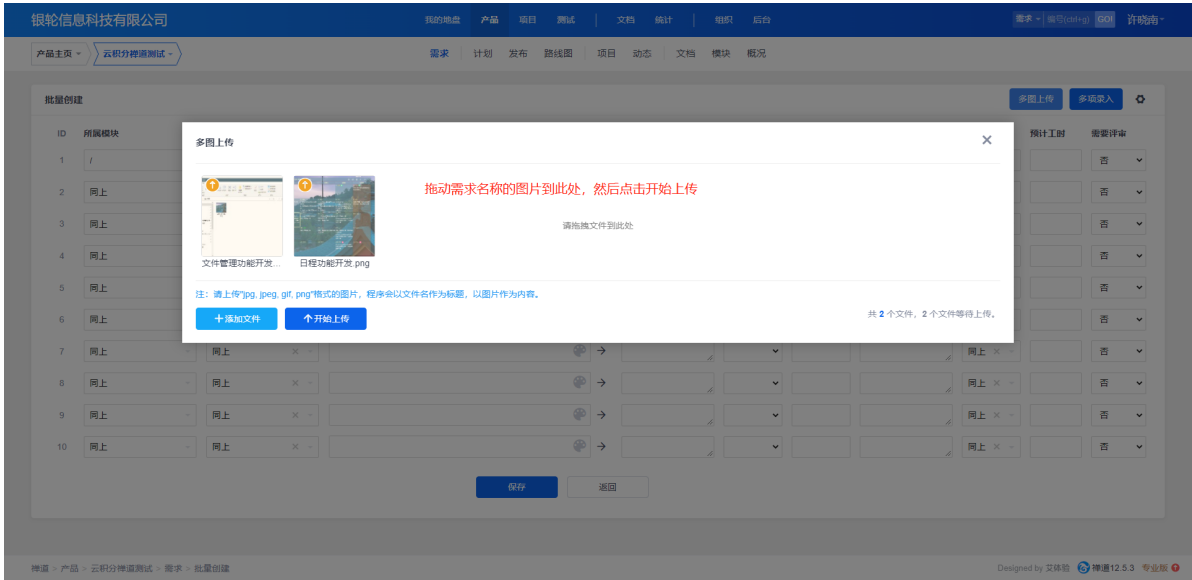

## 2.2.4 任务下发


**执行人：**开发负责人

**工作内容：**关联项目需求，并针对需求进行任务拆分。


任务预计时间 = 任务工时

### 2.2.4.1 关联需求


根据项目排期，关联当期需要开发的需求到项目中

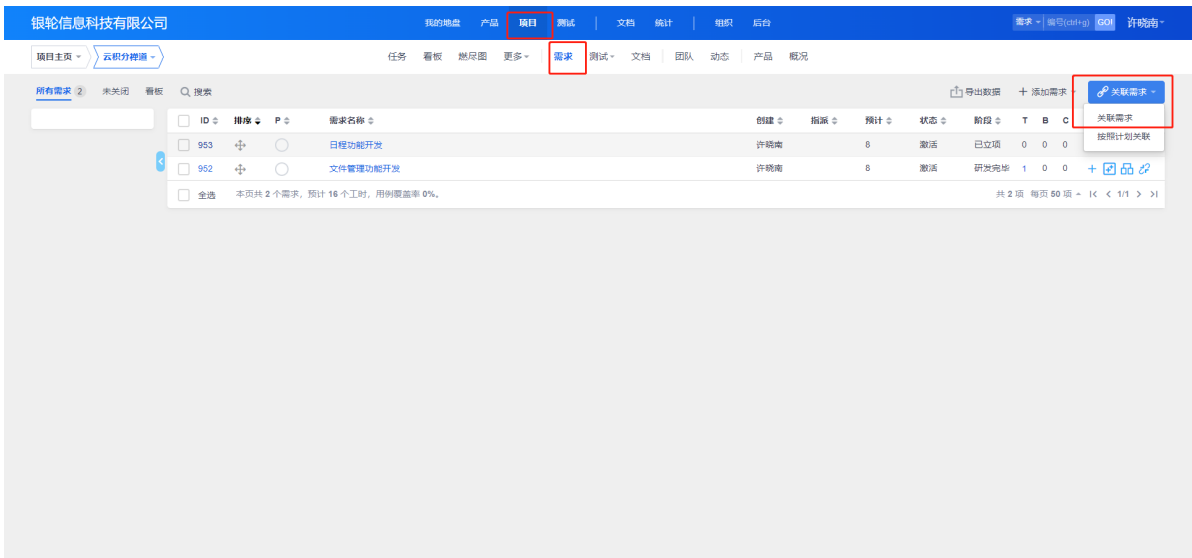

## 关联需求后可在需求列表进入任务拆分

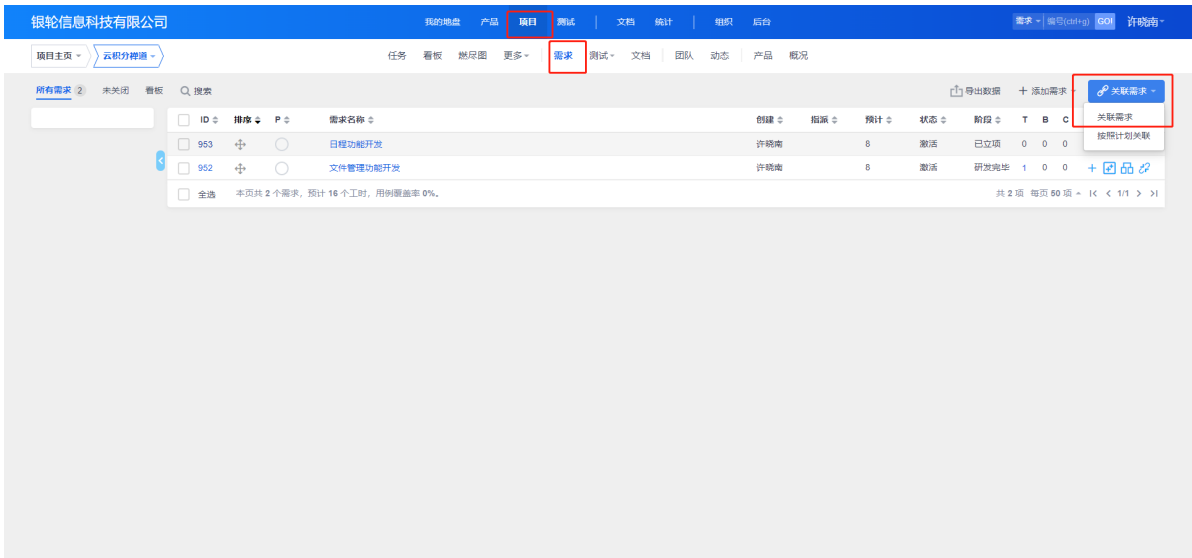

## 2.2.4.2 单条任务新增

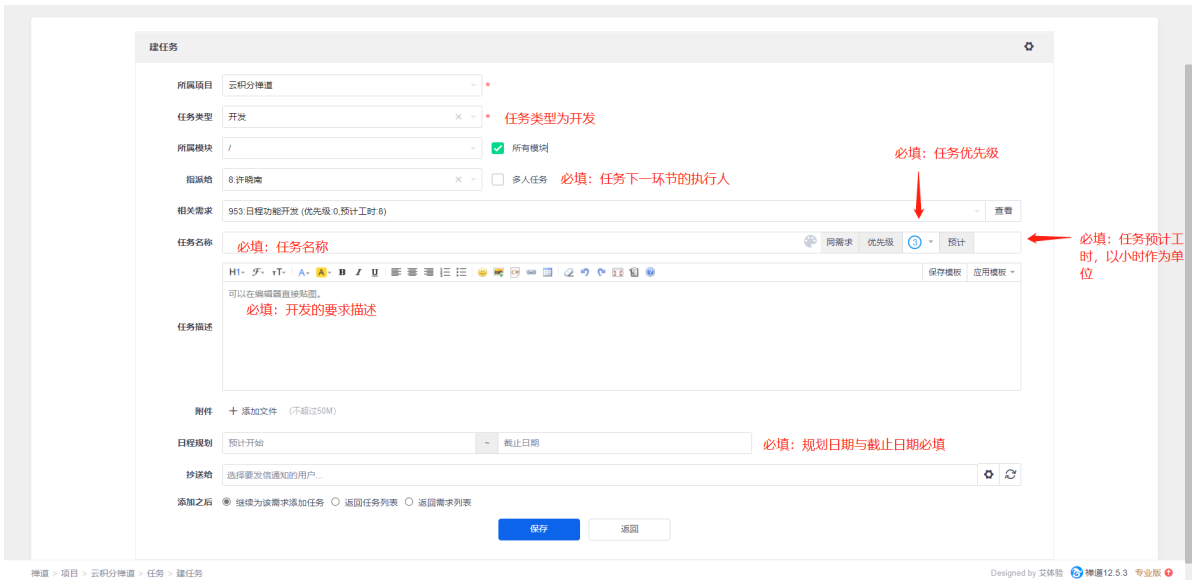

2.2.4.2 批量任务新增

银轮信息科技有限公司

我的地盘产品项目测试文档统计组织售后

任务管理新增任务

项目主页云积分禅道

任务看板燃尽图更多需求测试单文档团队动态产品概况

点击齿轮显示更多内容

批量创建

☐ 只列带任务需求

多页录入

| ID | 所属模块 | 相关需求   | 任务名称 *   | 类型 *     | 指派给       | 预计       | 预计开始 | 截止日期 | 任务描述                     | 优先级 |
|----|------|--------|----------|----------|-----------|----------|------|------|--------------------------|-----|
| 1  | /    | 953日程功 | 必填: 任务名称 | 必填: 任务类型 | 必填: 任务执行人 |          |      |      |                          | 3   |
| 2  | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        | 必填: 预计工时 |      |      |                          | 3   |
| 3  | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        |          |      |      | 必填: 任务截止日期, 无截止日期任务不累计积分 | 3   |
| 4  | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        |          |      |      | 必填: 任务描述, 主要为开发要求        | 3   |
| 5  | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        |          |      |      | 必填: 开发优先级                | 3   |
| 6  | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        |          |      |      |                          | 3   |
| 7  | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        |          |      |      |                          | 3   |
| 8  | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        |          |      |      |                          | 3   |
| 9  | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        |          |      |      |                          | 3   |
| 10 | 同上   | 同上     |          | 同上       | 同上        |          |      |      |                          | 3   |

保存

返回

禅道 > 项目 > 云积分禅道 > 任务 > 批量创建

Designed by 艾维数 禅道12.5.3 专业版

2.2.5 任务执行

执行人：任务执行人

工作内容：根据指派的任务，确认关联需求及任务描述，并在指定截止时间内完成任务

要求：

1. 每天开发的任务，需要在禅道任务中提交消耗工时及描述，如实填写总计消耗工时

银轮信息科技有限公司

我的地盘产品项目测试文档统计组织售后

任务管理新增任务

项目主页云积分禅道

任务看板燃尽图更多需求测试单文档团队动态产品概况

点击齿轮显示更多内容

所有模块

维护模块

模块设置

所有

本本周

任务

1641

测试任务

1550

待开发

全部

本页共 2 个任务

1641 测试任务

ID

日期

总计消耗

预计剩余

备注

操作

1

2022-01-18

4

4

完成了XXX及YYY的开发工作

必填: 当天完成工作的描述

2

2022-01-18

必填: 任务执行日期 必填: 预计剩余工时

3

2022-01-18

必填: 当天消耗工时

保存

1. 点击按钮进行工作提交

禅道 > 项目 > 云积分禅道 > 任务列表

Designed by 艾维数 禅道12.5.3 专业版

2. 若任务完成，则设置剩余工时为0，或点击按钮完成任务。




3. 完成的任务需要指派给开发负责人，开发负责人根据功能完成情况，进行测试环境发布，并通知测试人员。

## 2.2.6 新增测试用例（可选）

**执行人：**测试人员

**工作内容：**根据项目需求及验收标准，设计测试用例

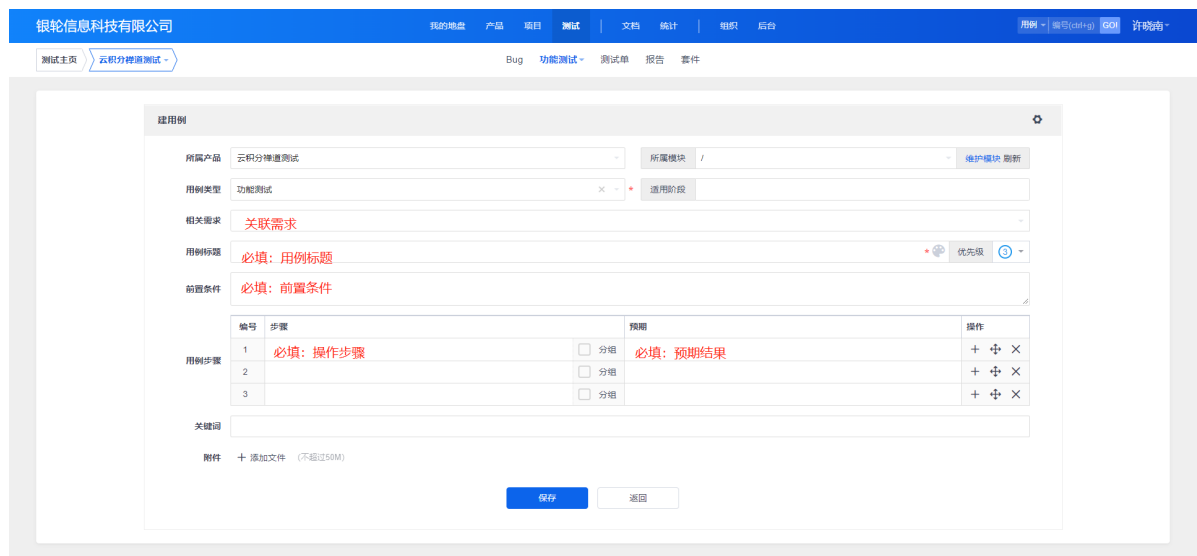

## 2.2.7 功能测试&BUG提交


**执行人：**测试人员

**工作内容：**根据项目需求及验收标准或测试用例对开发完成的功能进行验证


**要求：**

1. 推荐测试时进行录屏，方便重现BUG
2. 发现BUG后应

**方式一：按用例提交测试及转BUG**

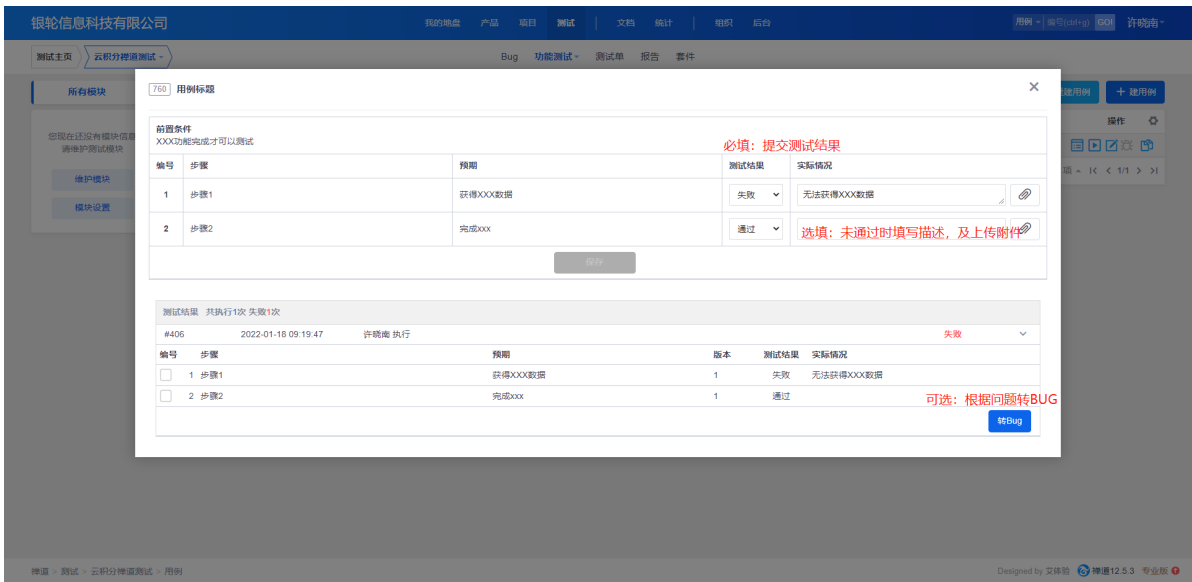

## 方式二：直接创建BUG

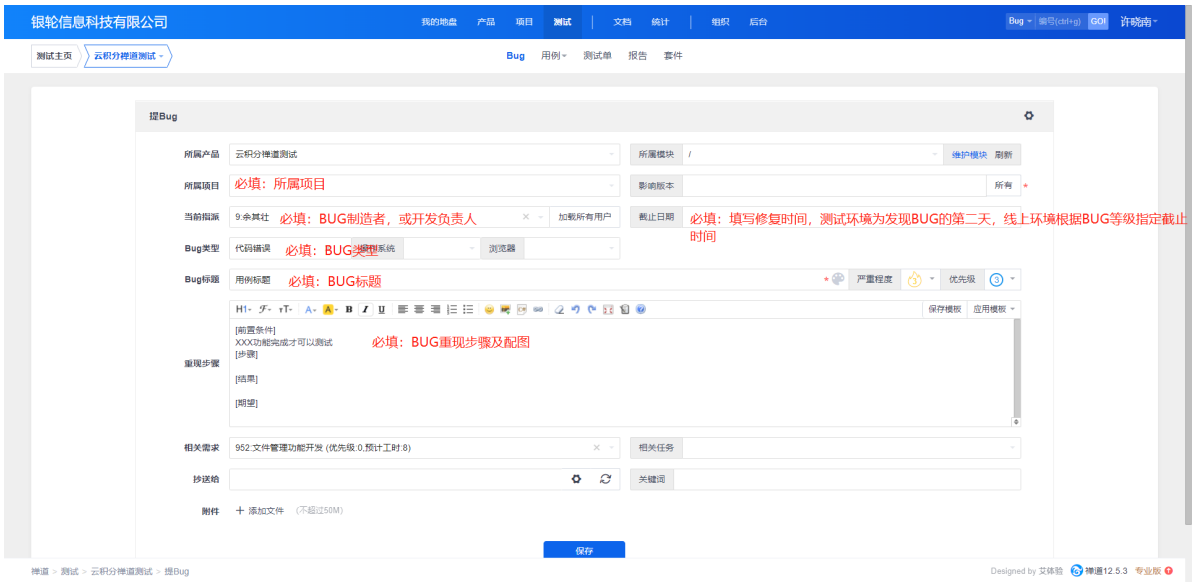

## 2.2.8 BUG确认及修复

执行人：开发人员

工作内容：根据测试人员提交的bug记录，确认BUG及修复BUG

要求：

1. 测试人员提交BUG后，尽早对BUG进行确认，若可以快速修复，应修复并发版，支持测试人员后续测试执行。





2. 若BUG解决方案为设计如此，应将BUG指派给项目经理，对项目需求进行确认是否需要进行修改

## 2.2.9 BUG修复确认

**执行人：**测试人员

**工作内容：**根据BUG修复记录，对BUG修复进行验证，若未修复则重新激活并补充说明

## 2.2.10 需求变更

**执行人：**项目经理

**工作内容：**

1. 项目开发过程中若产生需求变更（优化设计、客户要求、逻辑漏洞），应视变更产生的影响确认是否需要召集开发团队进行重新评审。
2. 产生实际变更后，应更新需求文件及原型并提交最新版本到开发负责人或开发部门负责人进行原型发布
3. 变更内容要在原型第一页进行说明，详见原型发布说明

# 三、原型发布说明

项目在云积分立项后或需求变更后，需要提供原型文件进行发布

- **发布时间：**完整原型的发布时间应该在项目立项后，开发团队正式开发的起始日前。
- **原型发布：**
  1. 提供发布的原型须已清晰说明功能逻辑、界面展示要求及操作方式。
  2. 评审中确认的问题需要进行记录及更新原型，最终版的原型需要在二次评审后，三天内提交。
  3. 最终原型进行打包发布：设计者导出原型页面，提交到开发事业部负责处进行发布，并在项目群公告展示在线原型地址。
- 4. 发布原型要求发布到目前的华为云测试服务器119.3.17.60上，原型需要配置访问密码，仅提供项目群内成员进行访问。
- **原型变更：**

1. 在原型第一页增加一个项目需求变更说明，记录变更的时间，变更的模块，变更的内容，方便开发人员确认开发内容。
2. 如果变更内容较多或影响较大，需要进行需求变更评审，若产生大量的工时，需要进行任务排期调整。
3. 上线后发生变更，一般建议固定周期收集并设计方案，作为版本迭代重新评审需求及安排工时。
